


Pfingsten 09
25|05|2009 - 05|06|2009

- 1 Bau Decken und Wände Sanitär/Heizung Dauer ca. Pfingstferien+2 Wochen
- 2 Elektro Bohrungen durch die Geschosse Aufbau der vertikalen Trassen durch die darüber liegenden Klassenzimmer bis einschließlich 3.OG Montage der Kanäle in den Klassen Trasse im Foyer
- 3 Elektro Installationen Klassenzimmer Pfingsten bis Sommerferien 2009
- 4 Elektro Installationen Klassenzimmer Juli 2009

HERBST 2010 - HERBST 2011


- 5 Bau Decken und Wände Sanitär/Heizung ab Herbst 2010 bis Herbst 2011 Rückbau in einem möglich?

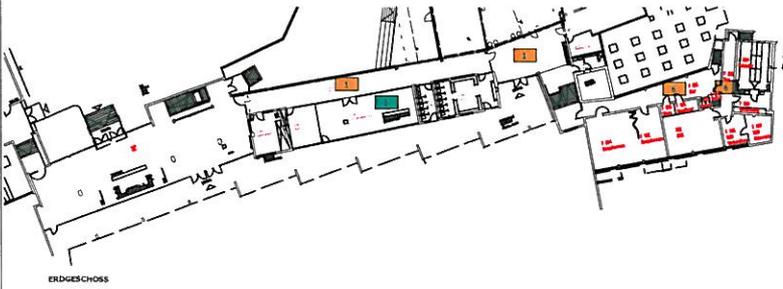

ERDGESCHOSS

Sommerferien 09
30|07|2009 - 11|09|2009


- 1 Bau Decken und Wände Sanitär/Heizung Dauer ca. Sommerferien +
- 2 Elektro Installationen Sommerferien 2009

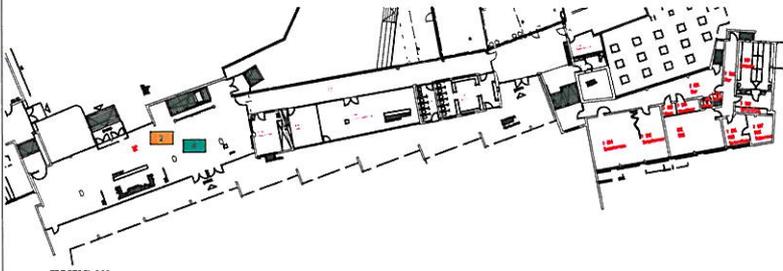

ERDGESCHOSS

Sommerferien 09
30|07|2009 - 11|09|2009


- 1 Bau Decken und Wände Sanitär/Heizung Dauer ca. Sommerferien +
- 2 Elektro Installationen Sommerferien 2009

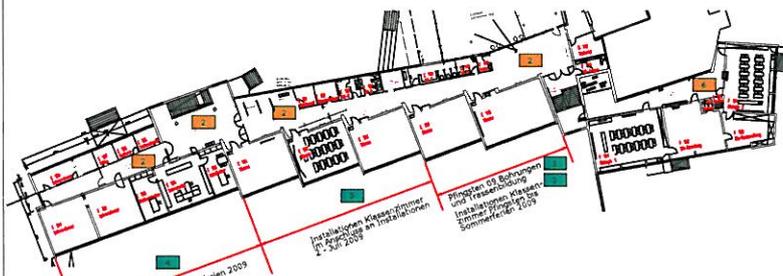

1. OBERGESCHOSS
Installationen Sommerferien 2009

Herbstferien 09
26|10|2009 - 30|10|2009


- 1 Bau Decken und Wände Sanitär/Heizung Dauer ca. Herbstferien + 8 Arbeitstage Halle zuerst - evtl. kurzzeitige Sperrung von 2 Klassenzimmern
- 2 Bau Decken und Wände Sanitär/Heizung Dauer ca. Ostern-Pfingstferien 2010
- 3 Elektro Installationen Ende Sommerferien 09 bis einschließlich Herbstferien 09

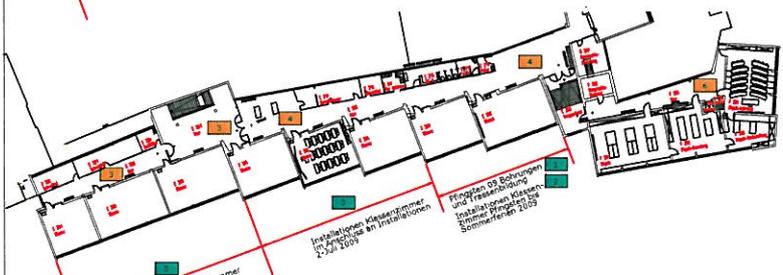

2. OBERGESCHOSS
Installationen Klassenzimmer ab Sommerferien 09 bis Herbstferien 09

Sommerferien 2010


- 1 Bau Decken und Wände Sanitär/Heizung Dauer ca. Sommerferien + evtl. kurzzeitige Sperrung Klassenzimmern

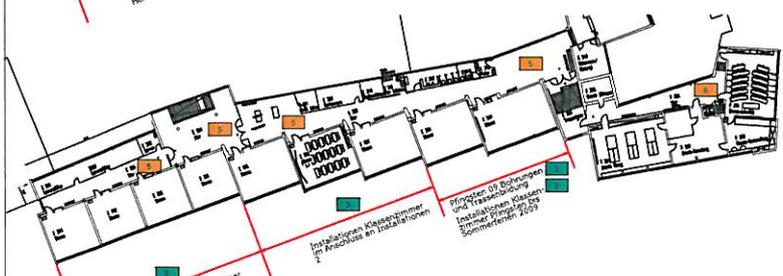

3. OBERGESCHOSS
Installationen Klassenzimmer Ende Sommer 09 bis Herbstferien 09

Herbst 2010 - Herbst 2011

- 1 Bau Decken und Wände Sanitär/Heizung ab Herbst 2010 bis Herbst 2011 Rückbau in einem möglich?

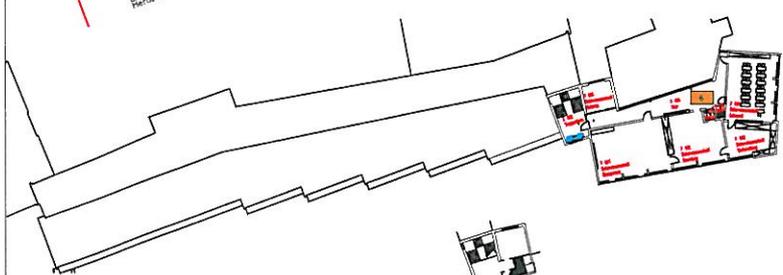

4. OBERGESCHOSS

In den angedachten Ausführungszeiträumen sind nicht oder nur teilweise bekannte Parameter wie z. B. bestehende Heizung- und Sanitärinstallationen in den Decken und deren Erhaltung/Änderung/Demontage, unvorhersehbare zusätzliche Arbeiten im Bereich Brandschutz sowie Leistungsprüfungen bzw. Leistungssuchen etc. im Gewerk Elektro nicht berücksichtigt.

Hauptsächlich können diese Arbeiten voraussichtlich parallel zu den anderen Arbeiten ausgeführt werden. Arbeiten können sich teilweise in die Schulzeiten ziehen und werden mit der Schulleitung abgesprochen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bunz für Architekt

VORABZUG 18|12|08

Bevorzugen	Baueingetragene Wohnung	Baueigentum	Projekt
Bauherr	Städt. Biersch. GbR/Gebäudeverwalt. Zwickauer Str. 30 08040 Bielefeld	Architekt	18 12 08
Bauherr	Städt. Biersch. GbR/Gebäudeverwalt. Zwickauer Str. 30 08040 Bielefeld	Architekt	TERMIN
TERMINSCHIEBE			Freigelegt
