


Anlage 2

Variante 2

2025 – Mitte 2027


Hier ist mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen

- z.B. Müllentsorgung
- Zugänglichkeit der Parzellen
- Teilweise deutlich mehr Baustellenverkehr

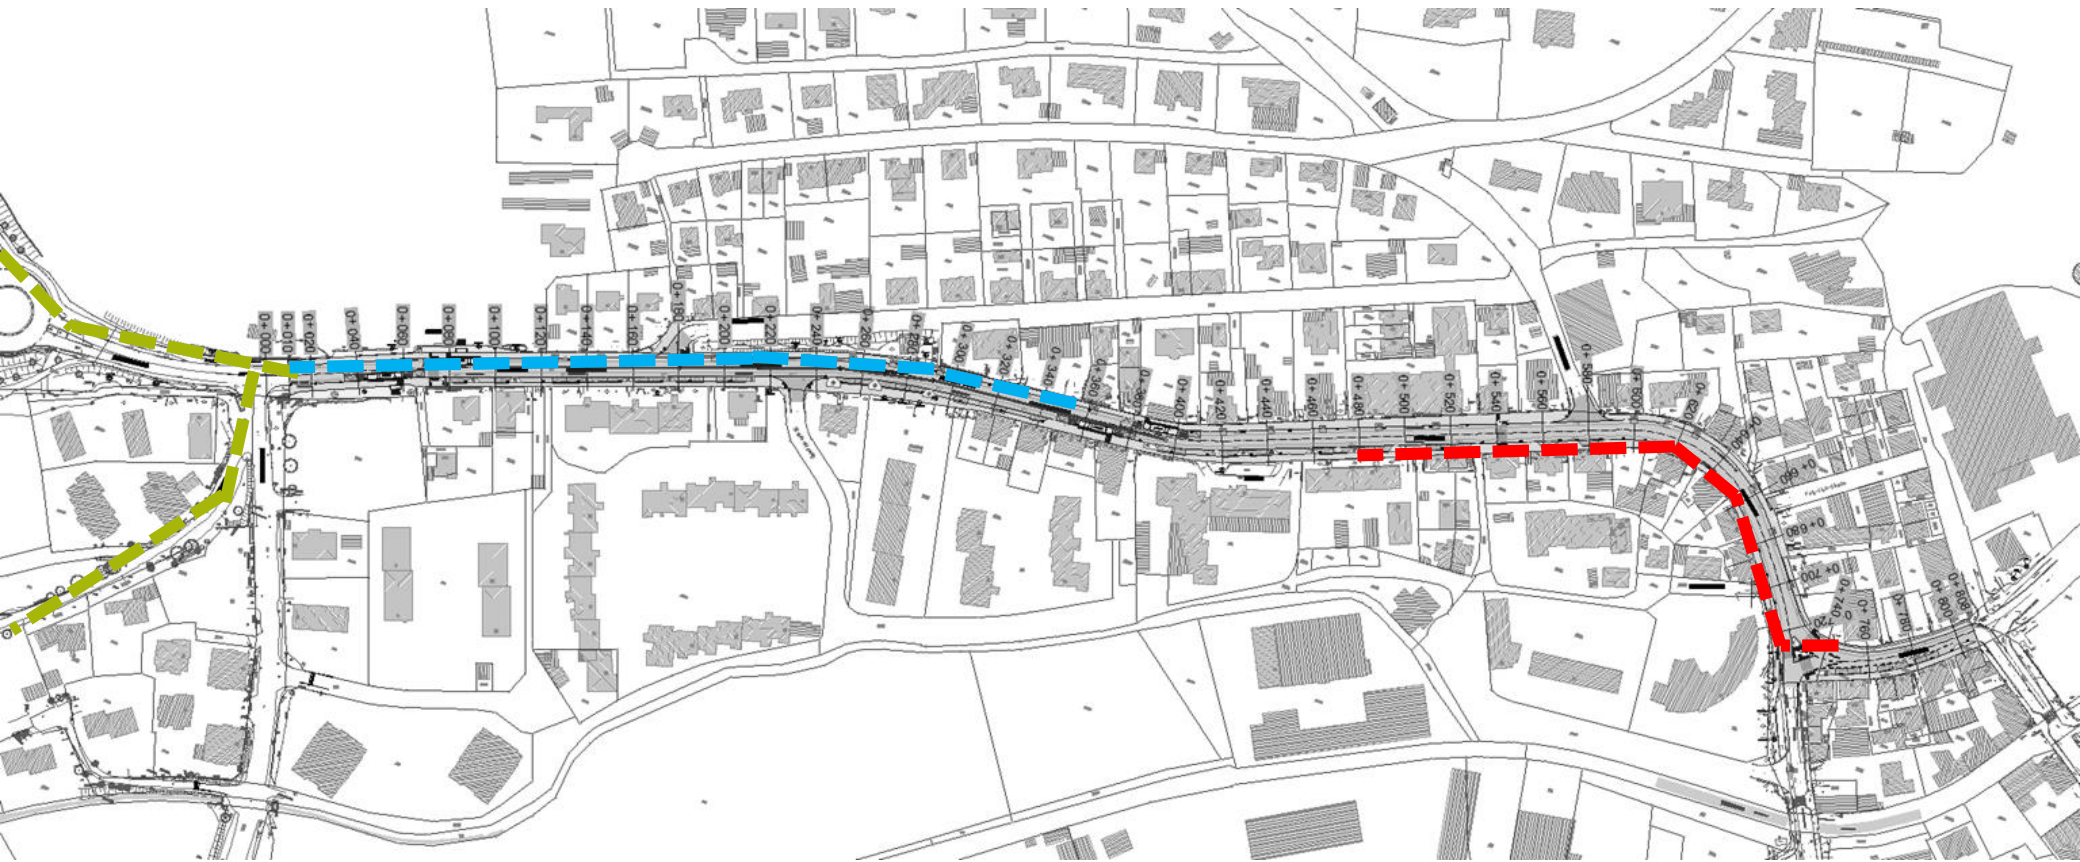

Verlegung GAS + WASSER innerhalb der Riedlinger Straße bis Tankstelle
1+2 Quartal 2025 / Sperrung voraussichtlich halbseitig

Verlegung TELEKOM innerhalb der Riedlinger Straße / Theaterstraße
1+2 Quartal 2025 / Sperrung voraussichtlich halbseitig / Querung Felsengartenstraße mit Vollsperrung

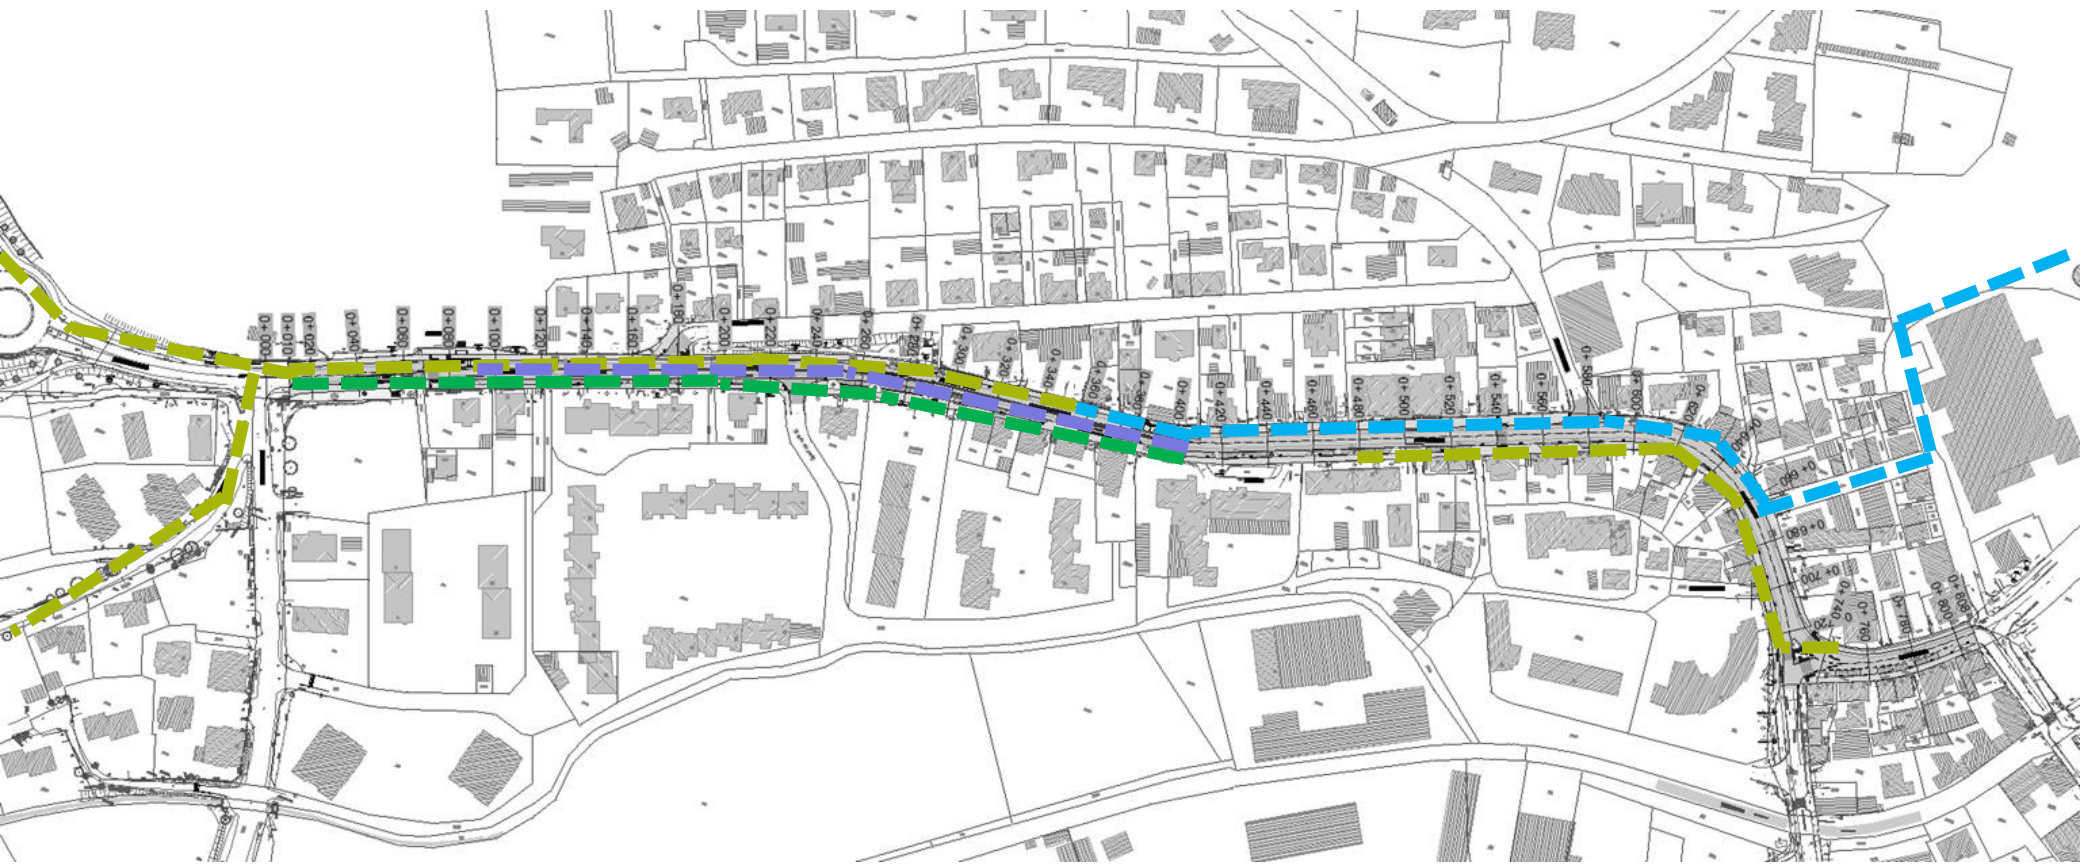

Verlegung GAS + WASSER innerhalb der Riedlinger Straße / Fritz-Lieb-Straße / Weißer Turm
3+4 Quartal 2025 / Sperrung voraussichtlich halbseitig


Verlegung KANALISATION und FERNWÄRME und innerhalb der Riedlinger Straße, ab Hardtsteige / nach Baufortschritt
4 Quartal 2025 / Vollsperrung Riedlinger Straße (zwischen Steigmühlstraße und Hardtsteige)



Verlegung GAS + WASSER innerhalb der Riedlinger Straße / Theaterstraße
1-4 Quartal 2026 / Vollsperrung Theaterstraße und Riedlinger Straße

Verlegung FERNWÄRME innerhalb der Riedlinger Straße / Theaterstraße (bis Hardtsteige)
1-4 Quartal 2026 / Vollsperrung Theaterstraße und Riedlinger Straße

STRASSENBAU in der Riedlinger Straße / Theaterstraße bis Hardtsteige

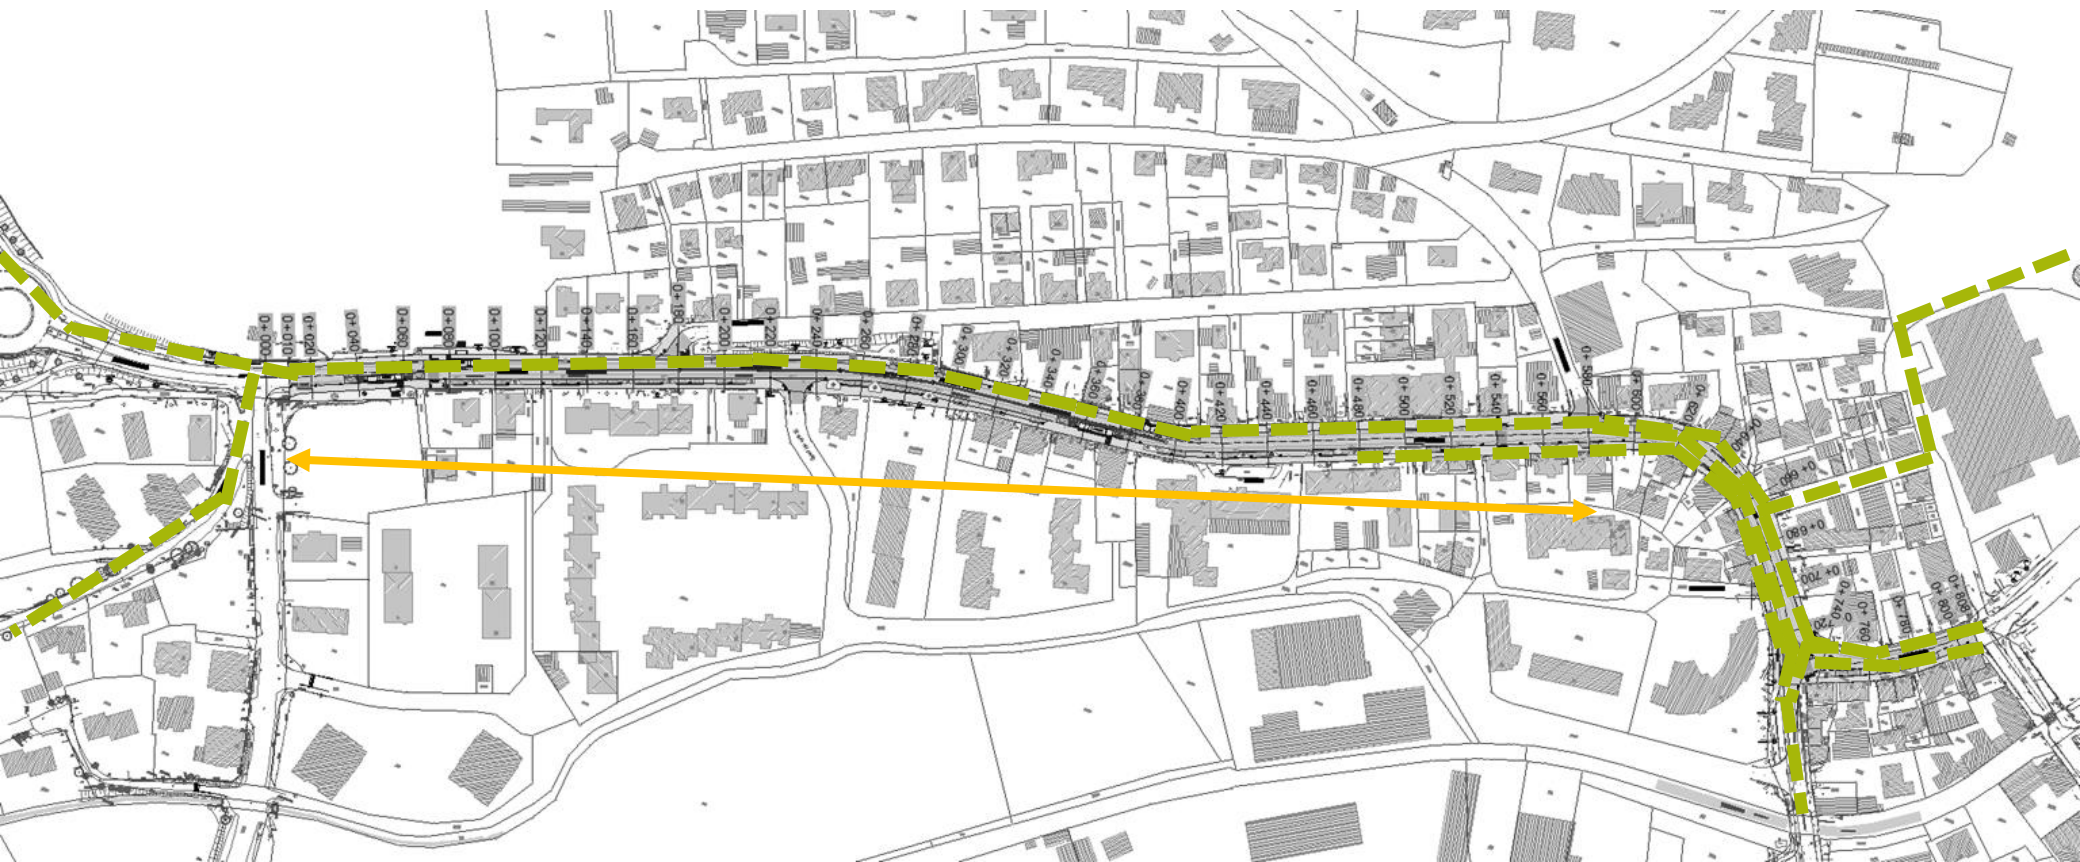

STRASSENBAU in der Riedlinger Straße (zwischen Steigmühlstraße und Hardtsteige)
1-2 Quartal 2027 / Vollsperrung Riedlinger Straße (zwischen Steigmühlstraße und Hardtsteige)
