

DREES &  
SOMMER


# PROJEKTSTATUS ITZ

Stand: 28.03.2019



# 1. KOSTENBERECHNUNG

## Historie

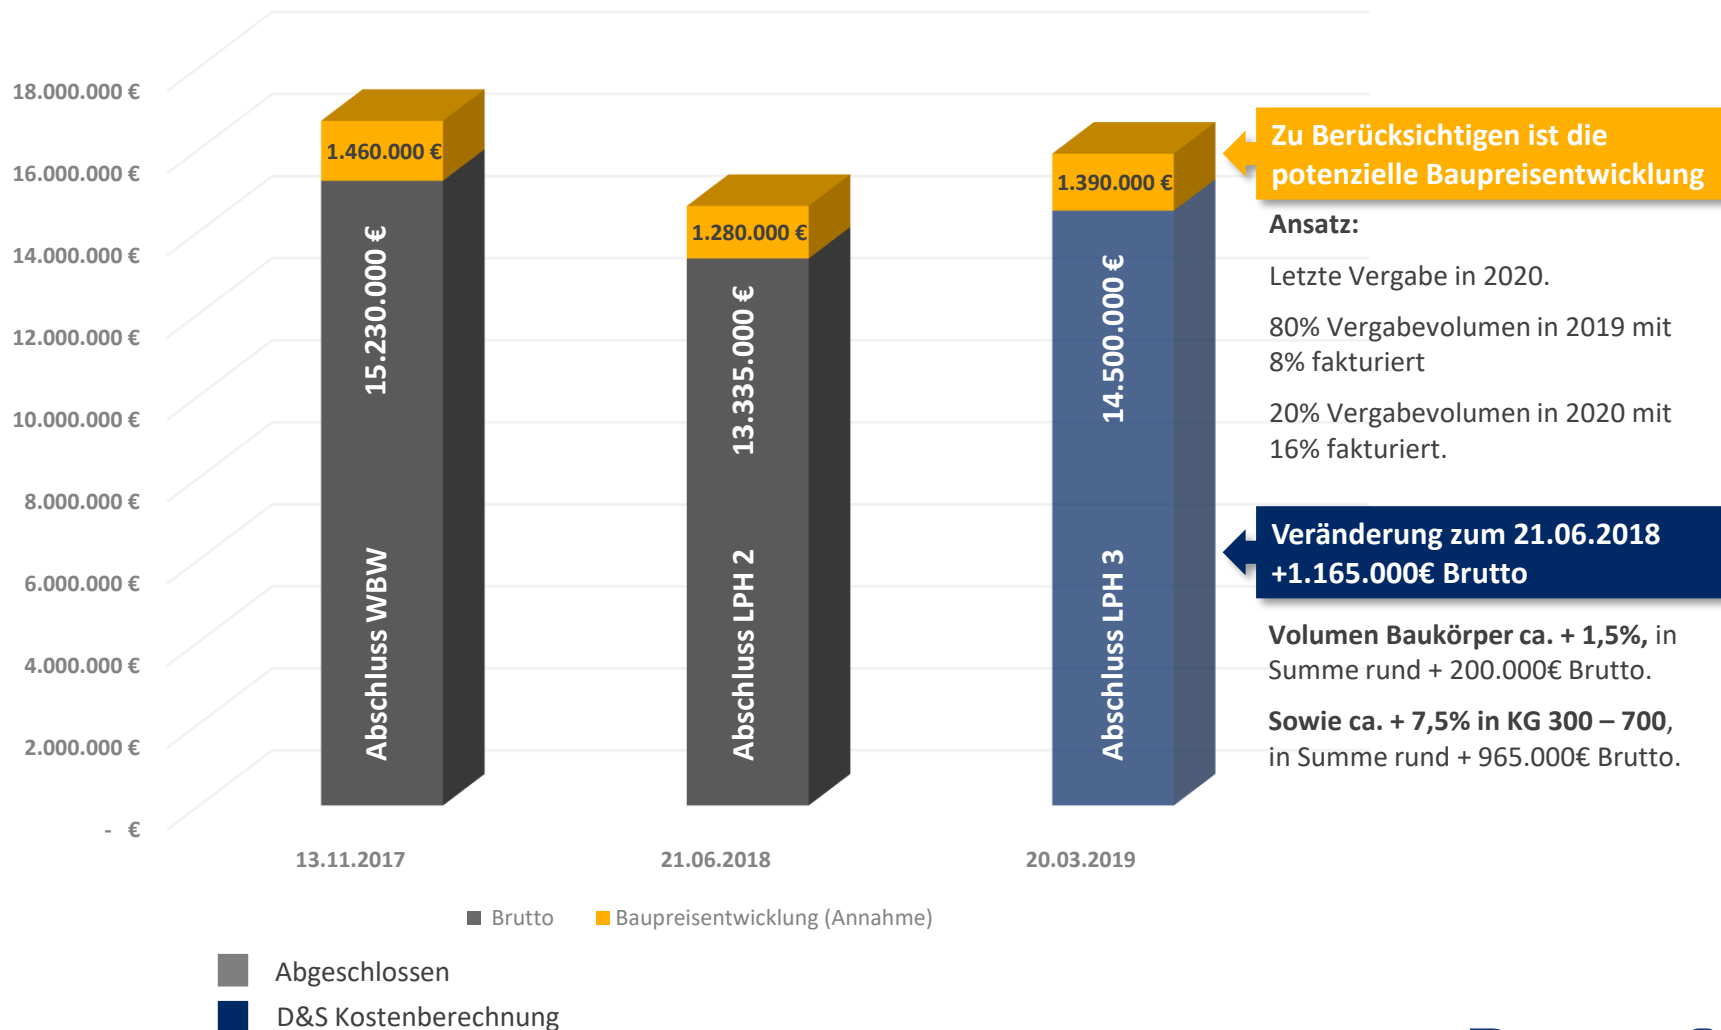


# 1. KOSTENBERECHNUNG

Veränderung zum 21.06.2018 im Detail

KG	Betreff	€ Brutto
KG 300-700	+ 1,5% Gebäudevolumen (Allg. Stand Planung)	+ 200.000€
300	Raumgerüst (Aktuelle Preisanfrage auf dem Markt)	+ 200.000€
300	Besenstrich Fassade (Optional)	+ 60.000€
300	Dachform (Kalkulation auf Grundlage Statik)	+ 55.000€
400	BIM Aufmaß (wesentlich detaillierter gegenüber dem Stand 21.06.18)	+ 250.000€
700	Berücksichtigung Stand Baunebenkosten	+ 400.000€
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.165.000€</b>

## 2. EINFLUSS „9 MONATE“ ZWISCHEN VERGABE UND START

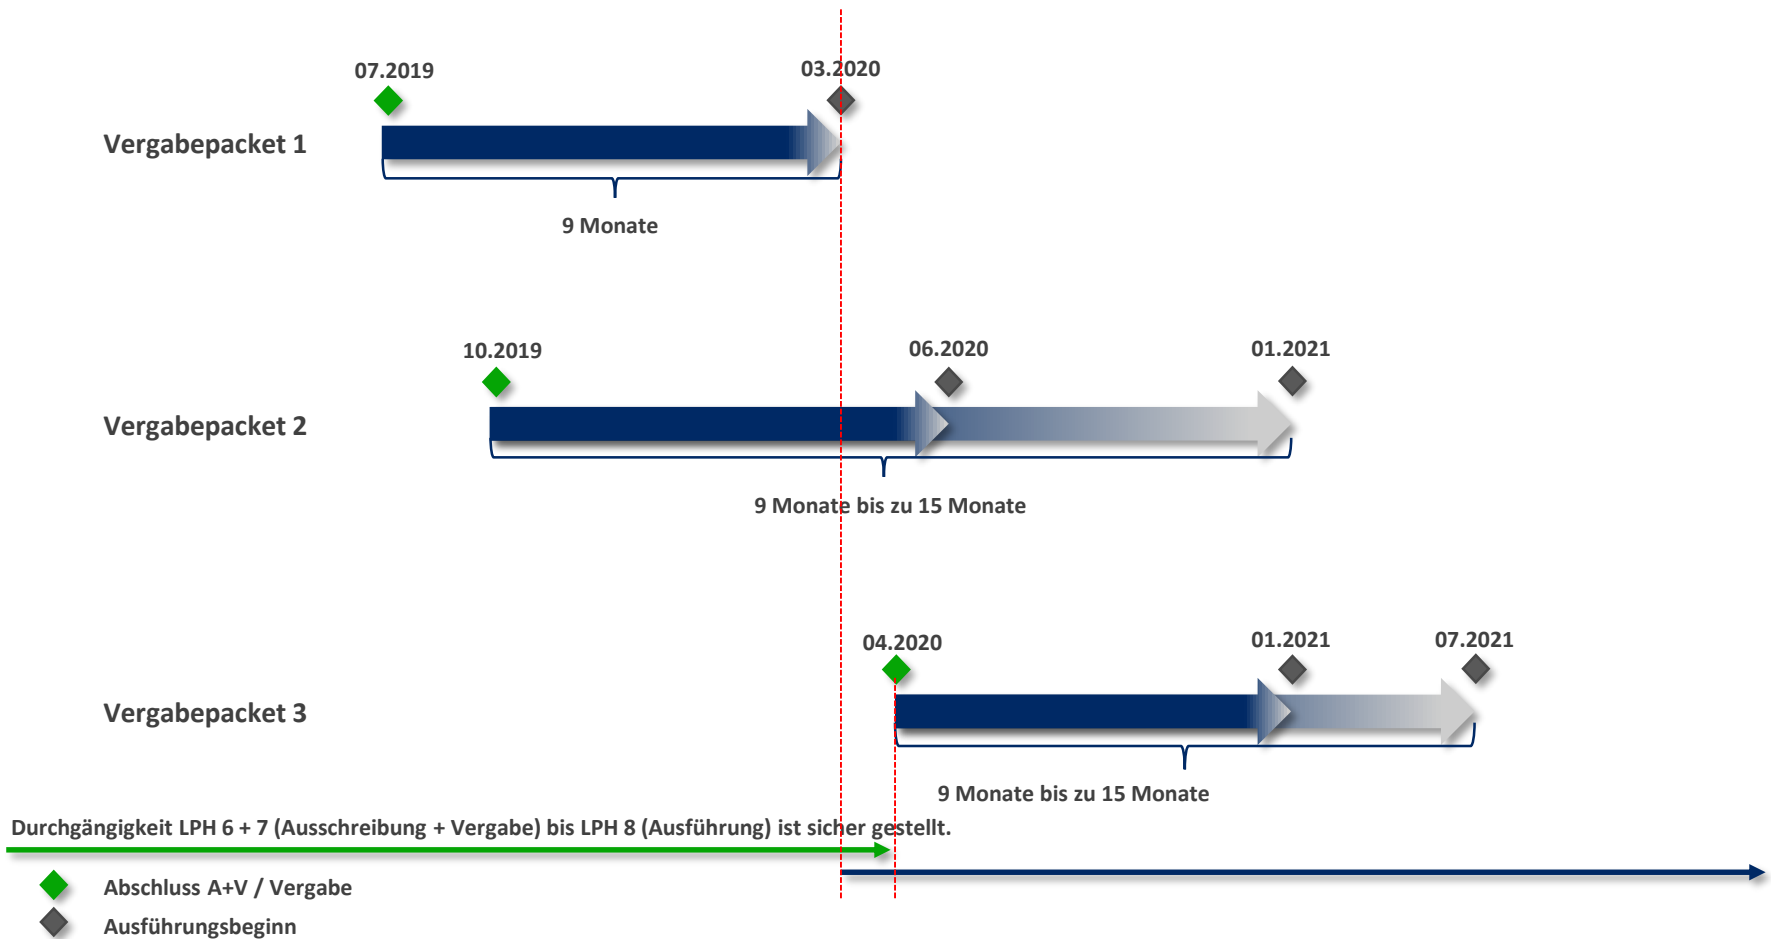

The background is a blue-tinted photograph of a modern city street. Tall buildings line the street, and a network of white lines and dots is overlaid on the right side, suggesting a digital or infrastructure theme. The overall mood is professional and forward-looking.

# **WIR BERATEN UND PLANEN ZUM BAUEN UND BETREIBEN**

**DREES &  
SOMMER**
