



Stadt Biberach an der Riß:


Thema: **Ausbau der Riedlinger Straße**
Sachstand / Zeitschiene / Abschnittsbildung

Planungsstand: 04/2024

Variante 1

2025 – Ende 2027


Variante mit einer möglichst guten Zugänglichkeit / Erreichbarkeit der Parzellen und Erhalt der grundsätzlichen Infrastruktur

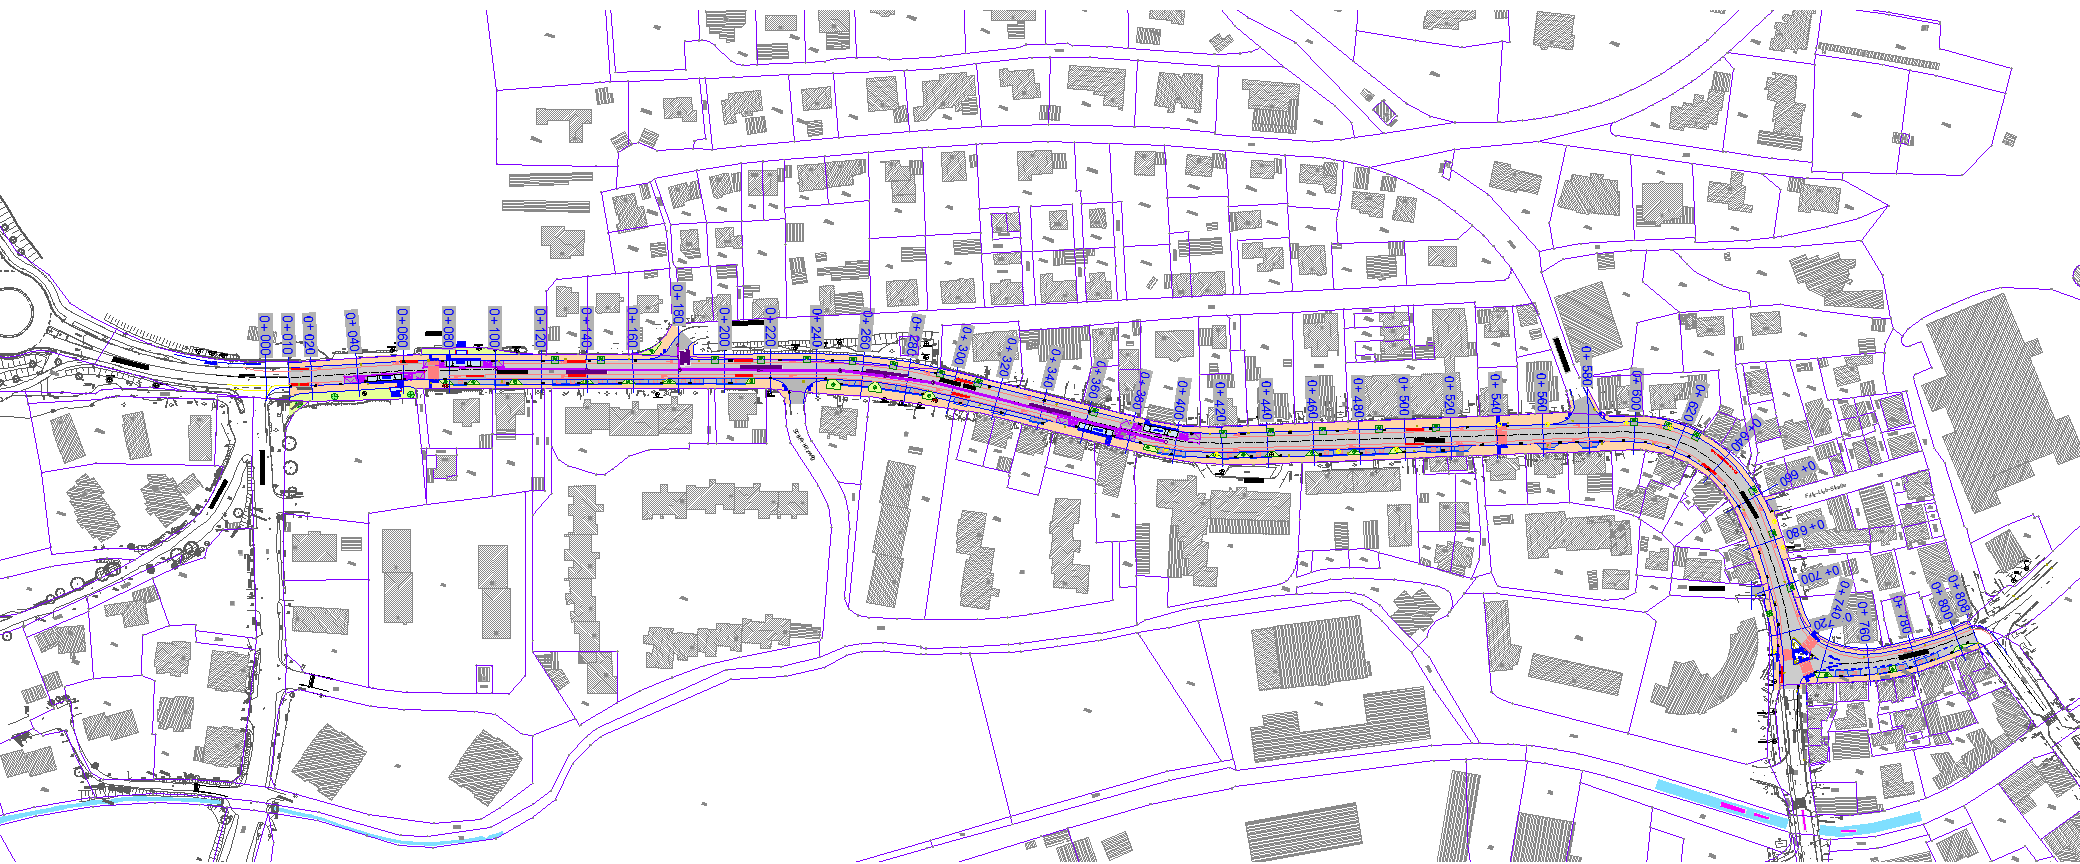


Planung **Ausbaubereich** von der Steigmühlstraße bis zur Kolpingstraße mit einer Gesamtlänge mit ca. 810 m

Grobdarstellung der Zeitschiene mit möglichen Abschnitten und den jeweilig notwendigen Straßensperrungen

- Vollausbau der Riedlinger Straße auf einer Breite zwischen 15 und 17 m auf -70 cm mit Anlegung von 2 Angebotsstreifen für den Radverkehr und der Herstellung von beidseitigen Pflanzquartieren auf der gesamten Ausbaulänge
- Anlegung von Parkplätzen und Buskaps
- Vergrößerung der Hauptwasserleitung Lindele-Jordanberg (DN 300 > DN 400)
- Erneuerung der Gashauptleitung
- Umlegung einer Telekom-Hauptversorgungstrasse (Kabelkanal ca. 100 cm x 80 cm)
- Erhalt / Umlegung von bestehenden Versorgungskabeln
- Neuverlegung von Beleuchtungskabeln / Glasfaserleerrohren
- Neuverlegung von zusätzlichen Trassen der Stromversorgung (Niederspannung und Mittelspannung)
- Neuverlegung einer Fernwärmeleitung inkl. Hausanschlussleitungen

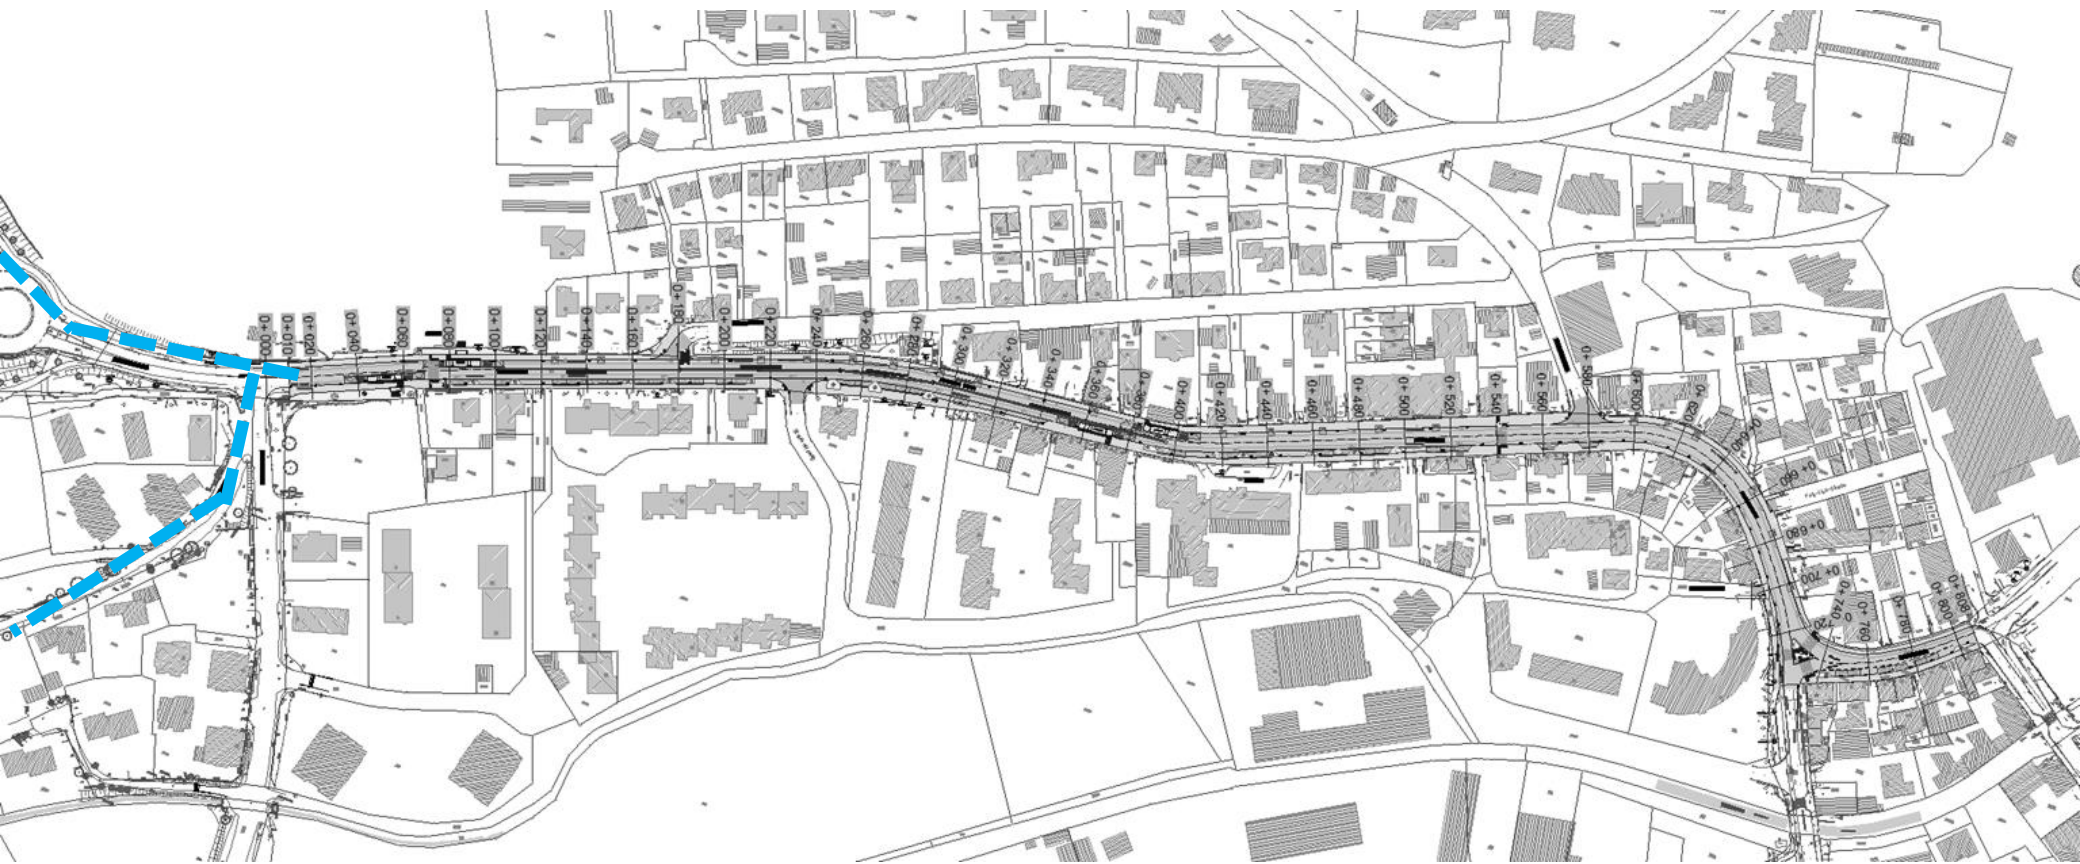


Verlegung GAS + WASSER außerhalb des Ausbaubereiches / Ziegelhausstraße bis PW-Wolfental
3+4 Quartal 2024 / Verkehr über Riedlinger Straße und Steigmühlstraße möglich

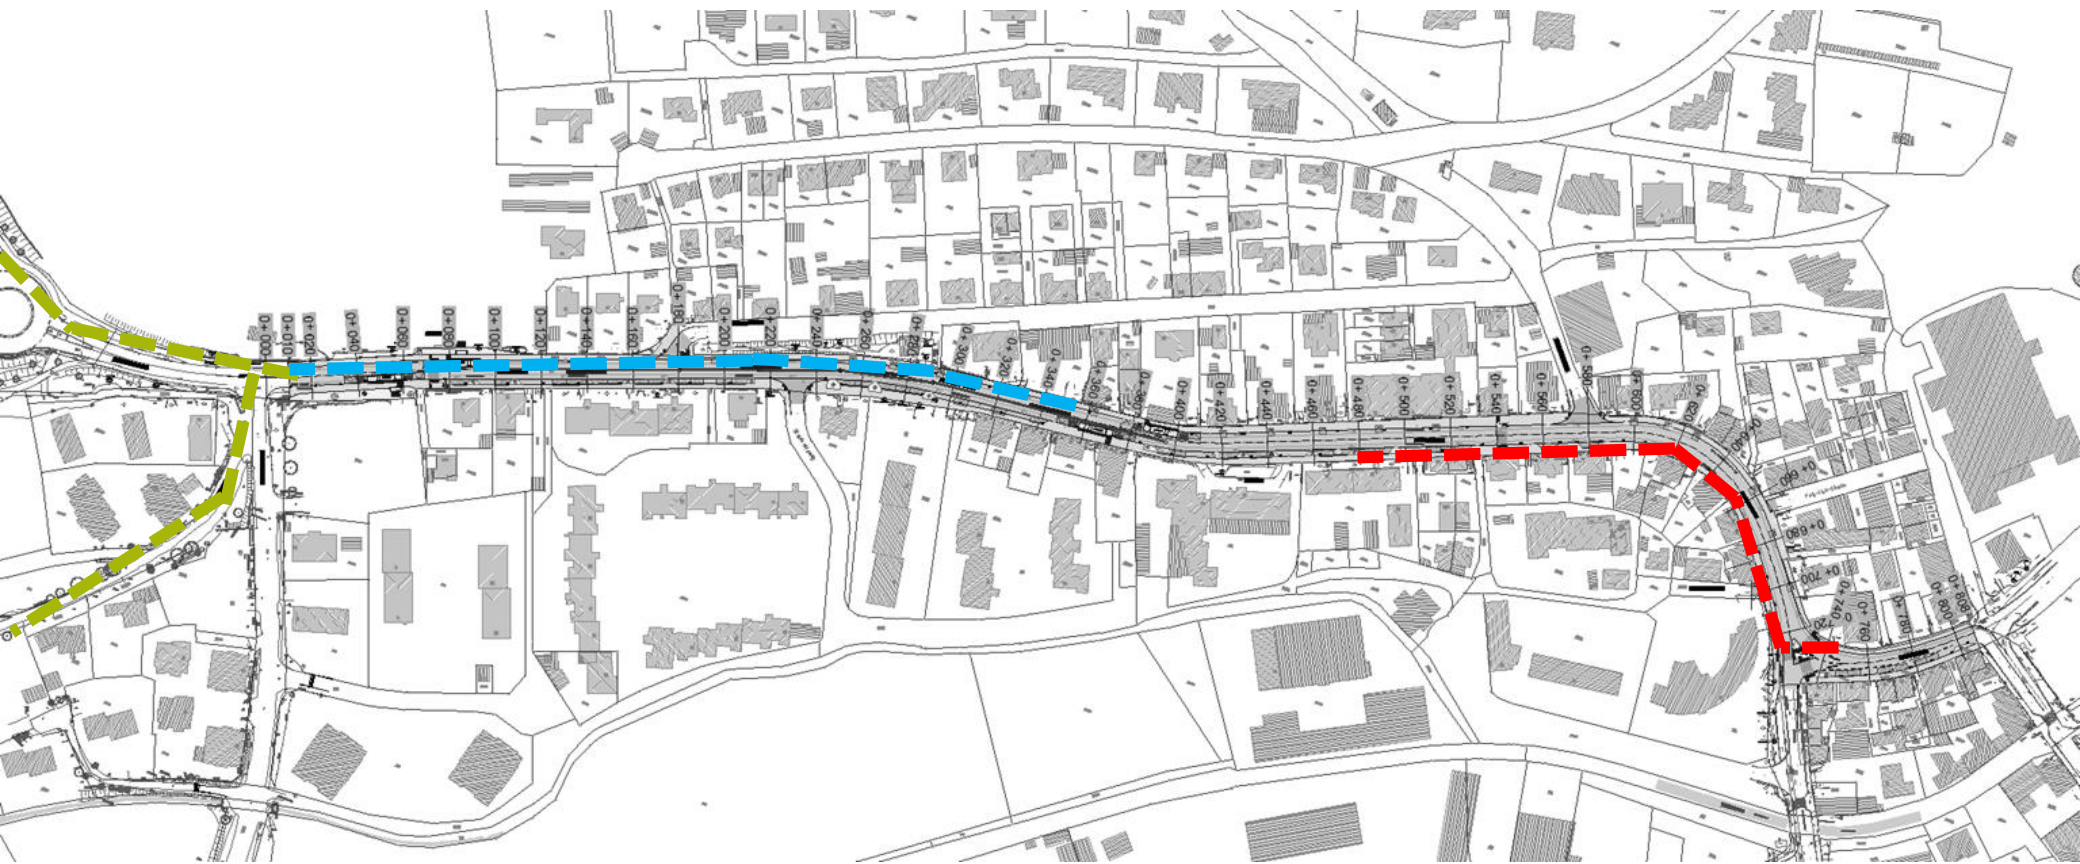


Verlegung GAS + WASSER innerhalb der Riedlinger Straße bis Tankstelle
1+2 Quartal 2025 / Sperrung voraussichtlich halbseitig

Verlegung TELEKOM innerhalb der Riedlinger Straße / Theaterstraße
1+2 Quartal 2025 / Sperrung voraussichtlich halbseitig / Querung Felsengartenstraße mit Vollsperrung

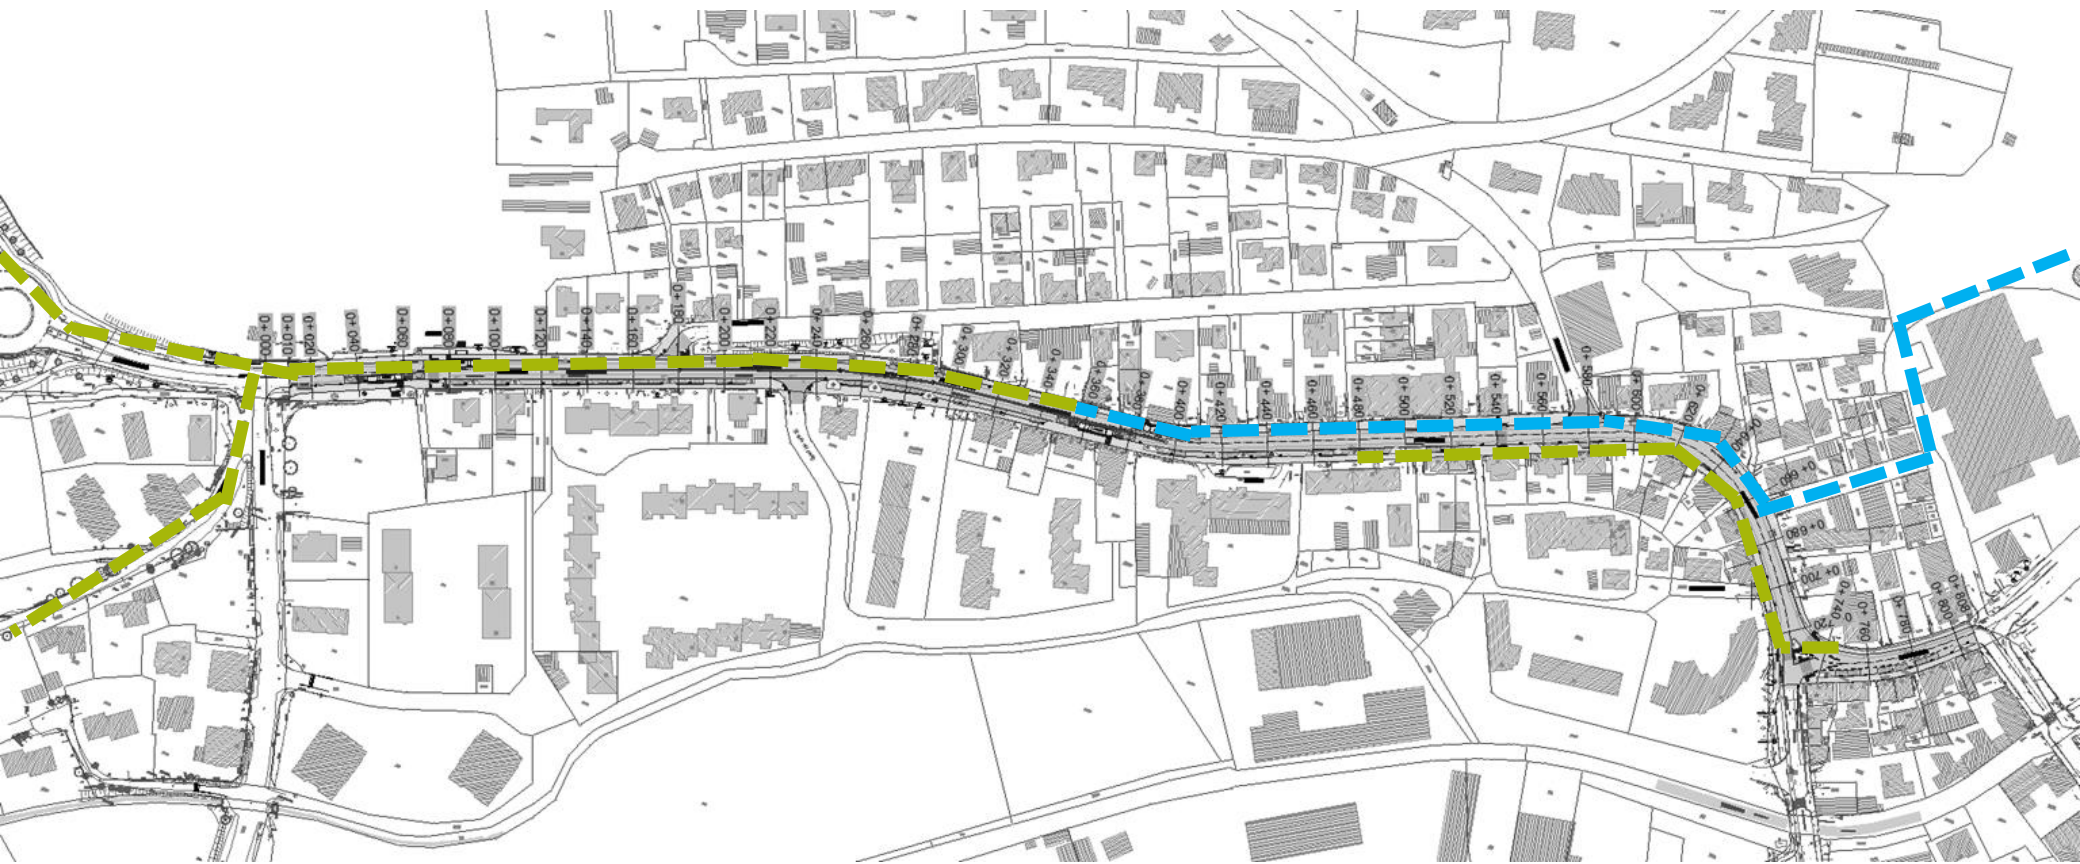



Verlegung GAS + WASSER innerhalb der Riedlinger Straße / Fritz-Lieb-Straße / Weißer Turm
3+4 Quartal 2025 / Sperrung voraussichtlich halbseitig

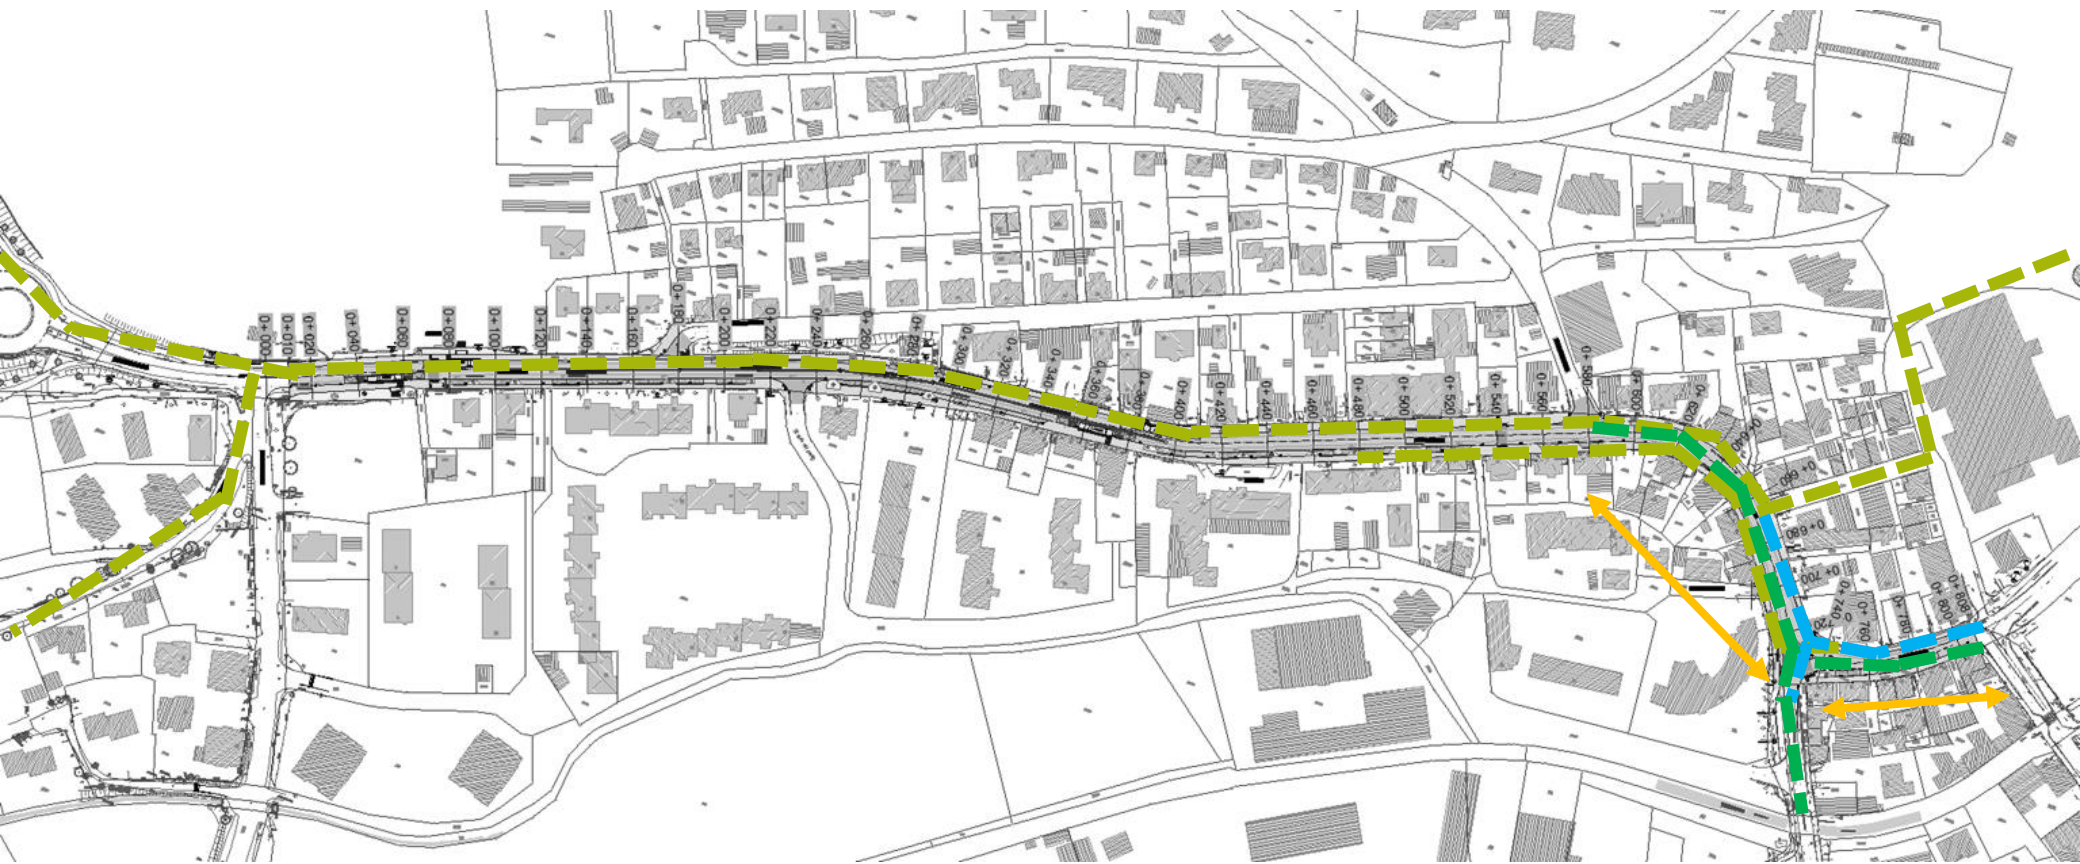


Verlegung GAS + WASSER innerhalb der Riedlinger Straße / Theaterstraße
1-4 Quartal 2026 / Vollsperrung Theaterstraße und Riedlinger Straße

Verlegung FERNWÄRME innerhalb der Riedlinger Straße / Theaterstraße (bis Hardtsteige)
1-4 Quartal 2026 / Vollsperrung Theaterstraße und Riedlinger Straße

STRASSENBAU in der Riedlinger Straße / Theaterstraße (bis Hardtsteige)

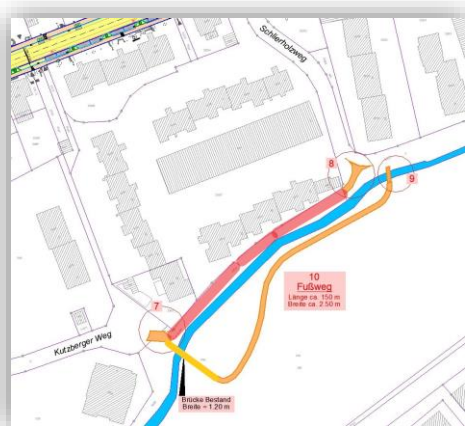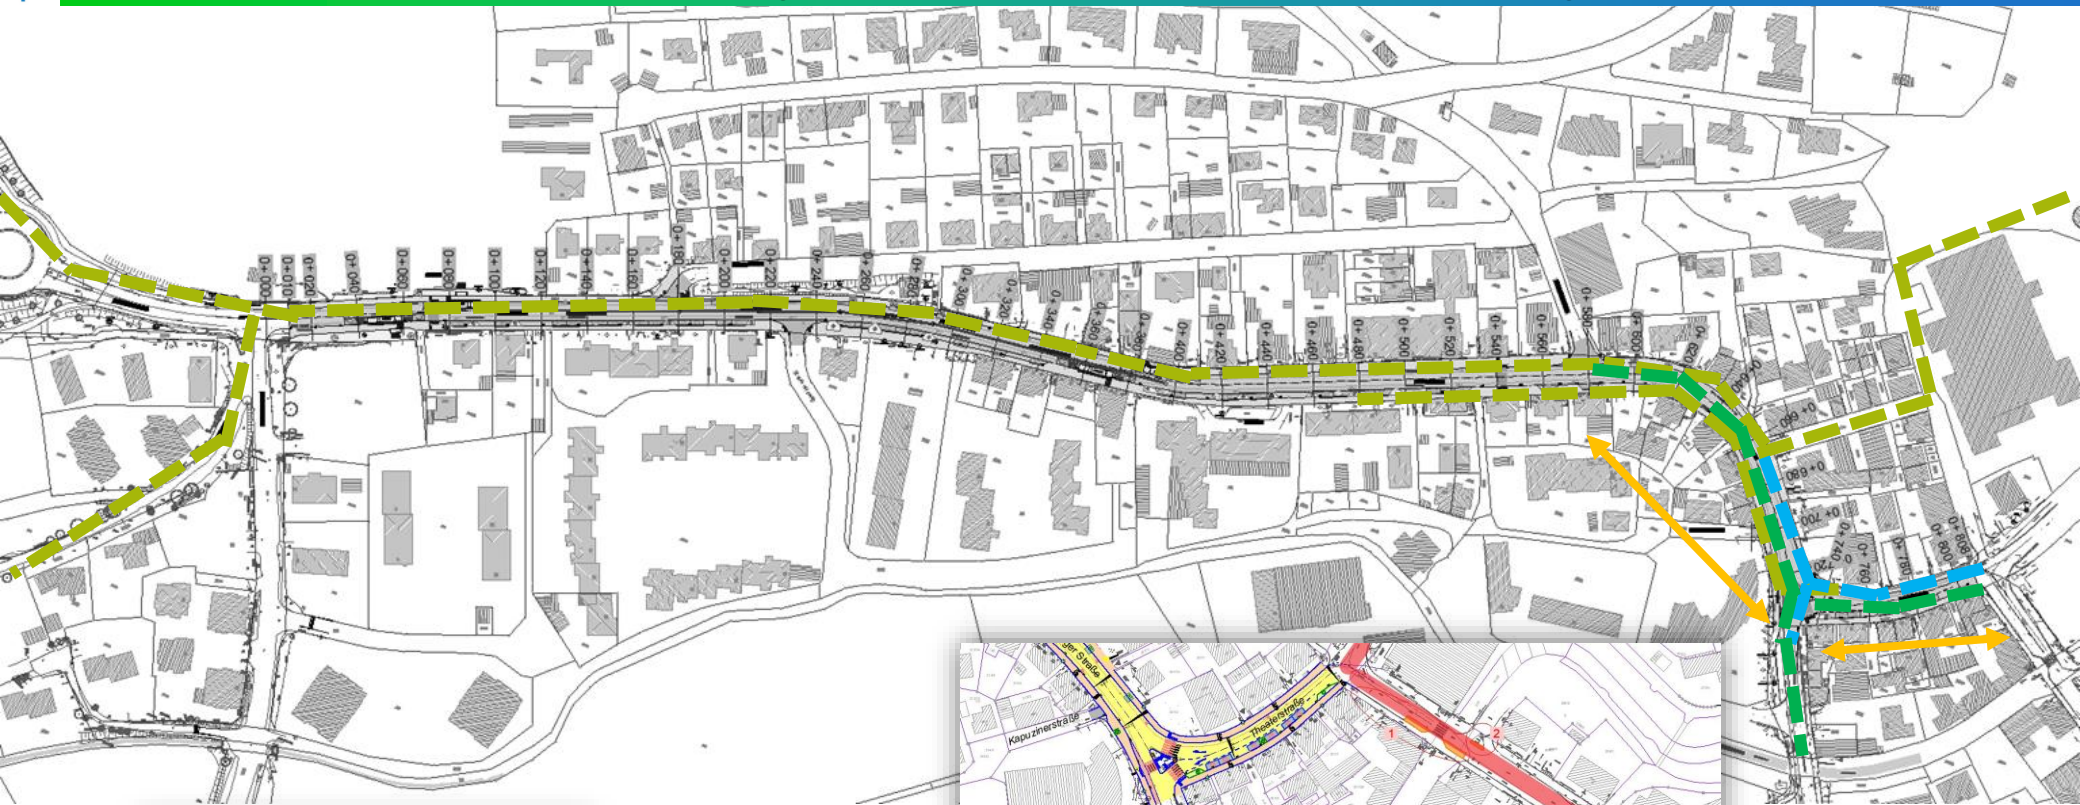

Provisorium für den Verkehr im Schlierholzweg

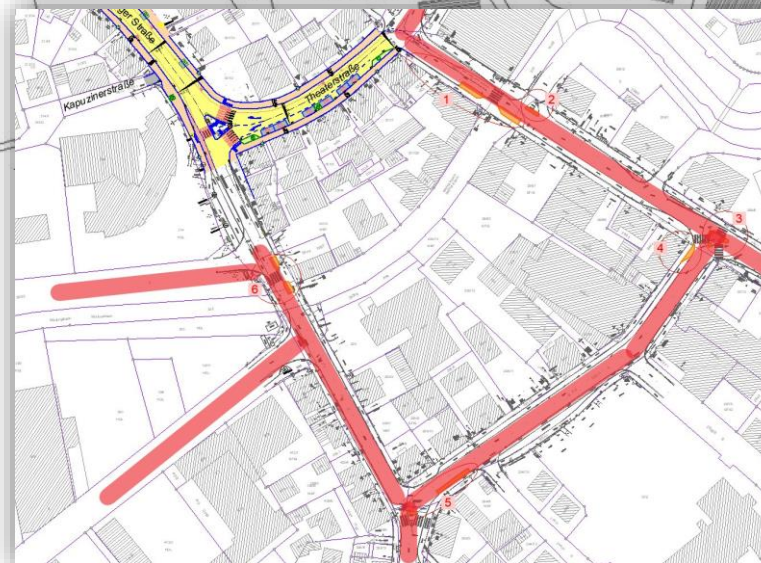

Während der Sperrung der Theaterstraße, Umleitung über die Kolpingstraße / Saulgauer Straße / Felsengartenstraße
Sperrung voraussichtlich 3-6 Monate (große Abhängigkeit von der Fernwärme!)



— — — — —
Verlegung KANALISATION und sonstige MEDIEN innerhalb der Riedlinger Straße, ab Hardtsteige
1-4 Quartal 2027 / Vollsperrung Riedlinger Straße (zwischen Steigmühlstraße und Hardtsteige)

— — — — —
Verlegung FERNWÄRME innerhalb der Riedlinger Straße ab Hardtsteige
1-4 Quartal 2027 / Vollsperrung (zwischen Steigmühlstraße und Hardtsteige)

— — — — —
STRASSENBAU in der Riedlinger Straße (zwischen Steigmühlstraße und Hardtsteige)

